



MUNICIPIO DE "NORIA DE ANGELES", ZAC.

PROGRAMA:

FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL).

OBRA Y/O ACCIÓN:

403002: AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE
MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

CONTRATO #:

NA-FIII-02-2022

CONTRATISTA.

C. RAUL MACIAS ROBLEDO

COMUNIDAD:

MARAVILLAS

EJERCICIO 2022



Moria de Angeles

MUNICIPIO DE MORIA DE ANGELES, S.A.C.

PROGRAMA

FUNCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS (MUNICIPAL)

68-470 A.C. 01

AMPLIACION DE 20 M DE RED DE ALICANTARIL LADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMPAÑIA MAXAYAL, AS. MORIA DE ANGELES, S.A.C.

CONTRATO N°

MA-FR-02-2002

CONTRATO N°

J. RAUL MACIAS TORREDO

COMUNICADO

N° 001/02

FECHA: 02/02/02



CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2022
MODALIDAD DE INVERSIÓN: FONDO III

I. PED

EJE: 2. Seguridad Humana
LINEA: 2.2. Pobreza y Desigualdad
ESTRATEGIA: 2.2.2. Impulsar la Inversión Pública para Ampliar la Infraestructura Social
PROYECTO: 2. Infraestructura Social Básica

UBICACIÓN:

REGIÓN	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN	<u>07</u>	<u>Sureste (Ojocaliente)</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>Zacatecas</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>035</u>	<u>Noria de Angeles</u>
LOCALIDAD	<u>0010</u>	<u>MARAVILLAS</u>

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO
(Ver norma técnica de domicilios geográficos) Ranchería

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARAVILLAS

AGEB (Zona de Atención Prioritaria) _____

TIPO DE VIALIDAD Calle

NOMBRE DE LA VIALIDAD Matamoros INT. _____

ENTRE VIALIDADES: _____ NUM. EXT.: _____

VIALIDAD POSTERIOR: Panfilo Natera, Sin Calle

24 de Febrero

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: **A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA**

GRADO DE MARGINACIÓN	MUY ALTO ()	ALTO (X)	MEDIO ()	BAJO ()	MUY BAJO ()	N/A ()
TIPO DE LOCALIDAD	URBANA ()		RURAL (X)			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM	LATITUD Y/O X			LONGITUD Y/O Y		
	<u>22.399628</u>			<u>-102.021621</u>		



CÉDULA DE IDENTIFICACION BÁSICA

MODALIDAD DE IDENTIFICACION: FONDO II

PROYECTO: A Infraestructura Social Básica
ESTRATEGIA: 2.2.2. Promover la inversión pública en la construcción de
LÍNEA: 2.2. Promover y Desarrollar
RUB: 2.2.2. Promover y Desarrollar
I. PED: 2.2.2.2. Promover y Desarrollar

LOCALIDAD	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	ESTADO	REGION	UNIFICACIÓN
BARAVILLAS	BARAVILLAS	Manabí	Manabí	0010

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO: (Ver nombre técnico de domicilio en el formulario)
 NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO: BARAVILLAS
 AGEN (Código de Asentamiento Humano):
 TIPO DE VALDAD: Establecimiento

NOMBRE DE LA VALDAD: [Blank]
 ENTRE VALDADES: [Blank]
 VALDAD POSTERIOR: [Blank]

ESTADO DE LA TELESECUNDARIA: [Blank]

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUD (X) 00° 00' 00" N, LONGITUD (Y) 78° 00' 00" W
 TIPO DE LOCALIDAD: [Blank]
 GRUPO DE BARRIO (Código): [Blank]



PROGRAMA
SUBPROGRAMA

CLAVE
ALC
A

NOMBRE
ALCANTARILLADO
AMPLIACION

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

TIPO DE OBRA NUEVA () AMPLIACIÓN (X) REHABILITACIÓN () PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO (X) ADMINISTRACIÓN DIRECTA ()

INSTANCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2021	130,670.80	\$0.00	\$0.00	130,670.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
METAS DEL PROYECTO	ML	90.00		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	
BENEFICIARIOS DIRECTOS	7	3	4	
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	23	10	13	
HOGARES BENEFICIADOS	7			

VI.- PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES:

FECHA DE: INICIO: 18/03/2022

TERMINO: 22/04/2022

ELABORÓ

Vo. Bo.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL

ING MANUEL BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

CÓDIGO
NOMBRE
A. CONTRATADO
A. APLICACION

ACT. HOGAR DE BEBE DE PRD DE MANANTIAL EN CALLE
TAMOR EN LA COMUNIDAD MANANTIAL NOR OESTE
ASOCIADA

TIPO DE OBRA

UNIDAD DE EJECUCION

REHABILITACION / PROYECTO

CONTRATISTA
ADMINISTRACION DIRECTA

INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

IN-VERSION	CONCEPTO	TOTAL	ESPECIAL	ORDINARIO	OTROS
INVERSION ARRIBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO CASI		20.00	20.00		
		20.00	20.00		
		20.00	20.00		

V - METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
HOGAR BENEFICIARIOS		7
BENEFICIARIOS DIRECTOS		23
BENEFICIARIOS INDIRECTOS		10
HOGAR BENEFICIARIOS		7
BENEFICIARIOS DIRECTOS		23
BENEFICIARIOS INDIRECTOS		10
HOGAR BENEFICIARIOS		7

VI - PERIODO DE EJECUCION

DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 23/04/2022
FECHA DE TERMINO: 23/04/2022

ELABORADO

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL
L. J. YANNE CASTILLO MORA

PRESIDENTE MUNICIPAL
MANUEL BECERRA DE LA ROSA



PRESUPUESTO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
PREELIMINARES				
Requisito en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejeucion.	M2	72.00	11.75	846.00
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	M3	14.40	45.92	661.25
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	M3	64.80	306.82	19,881.94
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	M3	3.60	600.00	2,160.00
Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua	M3	36.00	25.45	916.20
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón,con material producto de banco.	M3	36.00	154.14	5,549.04
<i>Instalación y junteo de tubería de P.V.C.Tubería de 200 mm (8")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.</i>	ML	90.00	31.00	2,790.00
	POZOS DE VISITA		SUBTOTAL	32,804.43



POZOS DE VISITA				
Excavación de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extraccion del material ,amacice o limpieza de plantilla y taludes de remocion acarreo hasta10mts.Dentro del area de contruccion.	M3	1.28	45.16	\$ 57.80
Excavación de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material duro en roca fija para desplante de estruaturas. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinari aadecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	M3	3.28	306.82	\$ 1,006.37
Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad , incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo necesario P.U.C.T.	PZA	2	6,928.77	\$ 13,857.54
Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ciega(W=122 KG)	PZA	2	3,272.03	\$ 6,544.06
	POZOS DE VISITA		SUBTOTAL	21,465.77
SUMINISTROS				
Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8")Ø que cumpla con lasNormas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.	ML	90.00	409.59	36,863.10
	SUMINISTROS		SUBTOTAL	36,863.10
DESCARGAS DOMICILIARIAS				
Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluyeestacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejeucion.	M2	25.20	11.75	296.10
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material "comun". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.	M3	5.04	45.92	231.44
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "duro". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area decontruccion.	M3	12.60	306.82	3,865.93
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicaci3n	M3	2.52	600.00	1,512.00
Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua	M3	10.08	25.45	256.54
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pis3n,con material producto de excavacion.	M3	8.40	154.17	1,295.03

DESCARGAS DOMICILIARIAS		SUMINISTROS		FOTOS DE VISITA	
1000	1000	1000	1000	1000	1000
2000	2000	2000	2000	2000	2000
3000	3000	3000	3000	3000	3000
4000	4000	4000	4000	4000	4000
5000	5000	5000	5000	5000	5000
6000	6000	6000	6000	6000	6000
7000	7000	7000	7000	7000	7000
8000	8000	8000	8000	8000	8000
9000	9000	9000	9000	9000	9000
10000	10000	10000	10000	10000	10000
11000	11000	11000	11000	11000	11000
12000	12000	12000	12000	12000	12000
13000	13000	13000	13000	13000	13000
14000	14000	14000	14000	14000	14000
15000	15000	15000	15000	15000	15000
16000	16000	16000	16000	16000	16000
17000	17000	17000	17000	17000	17000
18000	18000	18000	18000	18000	18000
19000	19000	19000	19000	19000	19000
20000	20000	20000	20000	20000	20000
21000	21000	21000	21000	21000	21000
22000	22000	22000	22000	22000	22000
23000	23000	23000	23000	23000	23000
24000	24000	24000	24000	24000	24000
25000	25000	25000	25000	25000	25000
26000	26000	26000	26000	26000	26000
27000	27000	27000	27000	27000	27000
28000	28000	28000	28000	28000	28000
29000	29000	29000	29000	29000	29000
30000	30000	30000	30000	30000	30000
31000	31000	31000	31000	31000	31000
32000	32000	32000	32000	32000	32000
33000	33000	33000	33000	33000	33000
34000	34000	34000	34000	34000	34000
35000	35000	35000	35000	35000	35000
36000	36000	36000	36000	36000	36000
37000	37000	37000	37000	37000	37000
38000	38000	38000	38000	38000	38000
39000	39000	39000	39000	39000	39000
40000	40000	40000	40000	40000	40000
41000	41000	41000	41000	41000	41000
42000	42000	42000	42000	42000	42000
43000	43000	43000	43000	43000	43000
44000	44000	44000	44000	44000	44000
45000	45000	45000	45000	45000	45000
46000	46000	46000	46000	46000	46000
47000	47000	47000	47000	47000	47000
48000	48000	48000	48000	48000	48000
49000	49000	49000	49000	49000	49000
50000	50000	50000	50000	50000	50000



Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	M.L.	42.00	22.50	945.00
Suministro de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ML.	42.00	225.45	9,468.90
Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25	PZA	7.00	130.66	914.62
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM	PZA	7.00	182.34	1,276.38
Limpieza general de la obra	m2	132.00	11.00	1,452.00
DESCARGAS			SUBTOTAL	\$ 21,513.94
			TOTAL	112,647.24
			IVA 16%	18,023.56
			TOTAL	130,670.80



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
12/31/00	BALANCE	100.00		
01/15/01	PAYROLL	150.00	1001	CHASE
02/15/01	PAYROLL	150.00	1002	CHASE
03/15/01	PAYROLL	150.00	1003	CHASE
04/15/01	PAYROLL	150.00	1004	CHASE
05/15/01	PAYROLL	150.00	1005	CHASE
06/15/01	PAYROLL	150.00	1006	CHASE
07/15/01	PAYROLL	150.00	1007	CHASE
08/15/01	PAYROLL	150.00	1008	CHASE
09/15/01	PAYROLL	150.00	1009	CHASE
10/15/01	PAYROLL	150.00	1010	CHASE
11/15/01	PAYROLL	150.00	1011	CHASE
12/15/01	PAYROLL	150.00	1012	CHASE
12/31/01	BALANCE	100.00		
TOTAL		1,700.00		



CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC		
FECHA DE:	INICIO:	18/03/2022	TERMINO:	22/04/2022

PROGRAMADO TODO EL AÑO

FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)	
ML	90.00		130,670.80	

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	30%	\$39,201.24
ABRIL	70%	\$91,469.56
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$130,670.80



CAL THORACICA EN EL...

NOMBRE DE LA...		MAYOR...	
...		...	

PROGRAMA Y TIPO DE...			
TIPO DE...
...
...
...

MES	FÍSICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	30%	...
ABRIL	70%	...
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DIEMBRE		
TOTAL		10000.00



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CALENDARIO DE EJECUCION

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PREELIMINARES	
trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	MARZO
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	MARZO
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	MARZO
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	MARZO
Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua	ABRIL
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón,con material producto de banco.	ABRIL
Instalación y junteo de tubería de P.V.C.Tubería de 200 mm (8")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
0	ABRIL
POZOS DE VISITA	ABRIL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA COMUNIDAD BÁSICA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

AMPLIACION DE LA RED DE ALcantarillado EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MATAVILLAS NOROCCIDENTALES TAC

FECHA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
MARZO	PROYECTO DE ALcantarillado
MARZO	Trabajo de campo para el estudio de las condiciones de saneamiento en las viviendas de la comunidad.
MARZO	Elaboración del expediente técnico para la ampliación de la red de alcantarillado en la calle Matamoros.
MARZO	Elaboración del expediente administrativo para la ejecución de la obra.
MARZO	Inicio de las obras de ampliación de la red de alcantarillado.
MARZO	Trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.
ABRIL	Continúa el trabajo de campo para el seguimiento de las obras.



Excavación de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extraccion del material ,amacice o limpieza de plantilla y taludes de remocion acarreo hasta10mts.Dentro del area de contruccion.	ABRIL
Excavacion de 0,00 a 2,00mts.de profundidad en material duro en roca ija para desplante de estruturas. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinari aadecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	ABRIL
Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad , incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo necesario P.U.C.T.	ABRIL
Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ciega(W=122 KG)	ABRIL
0	ABRIL
SUMINISTROS	ABRIL
Suministro de tuberiade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8")Ø que cumpla con lasNormas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.	
0	MARZO
DESCARGAS DOMICILIARIAS	
Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluyeestacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ABRIL
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material "comun". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	ABRIL
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "duro". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	ABRIL
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	ABRIL
Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua	ABRIL
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón,con material producto de excavacion.	ABRIL



Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreo ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
Suministro de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreo ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
Codo de PVC con junta hermetica de 15 cms.(6")SERIE 25	ABRIL
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM	ABRIL
Limpieza general de la obra	ABRIL



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.




ING GUADALUPE SOTO RIOS
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




ING MANUEL BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES ZAC

LUGAR: MARAVILLAS FECHA: 02/03/2022

INFORMACION ADICIONAL:

VALIDACION DE OBRAS DE FACILIDAD

LOS ABALDIO FIRMANTES HADEN EN EL PRESENTE PROYECTO

AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD MARINERA DE ANGEL ESTAN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE SE AUTORIZA LA EJECUCION COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES



MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO DE LA ROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPALIDAD DE MARAVILLAS

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

02/03/2022

FECHA

MARAVILLAS

LUGAR

INFORMACION ADICIONAL

Four horizontal lines for additional information.




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DEL MUNICIPIO

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES
ZAC





ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ЗАПОЛНИТЕ ЭТО ПОЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДАННЫМИ

ИЛИ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСЬ ИЛИ ПЕЧАТЬ ИЛИ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ






PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE LOCALIDAD

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

COLONIA MADERO

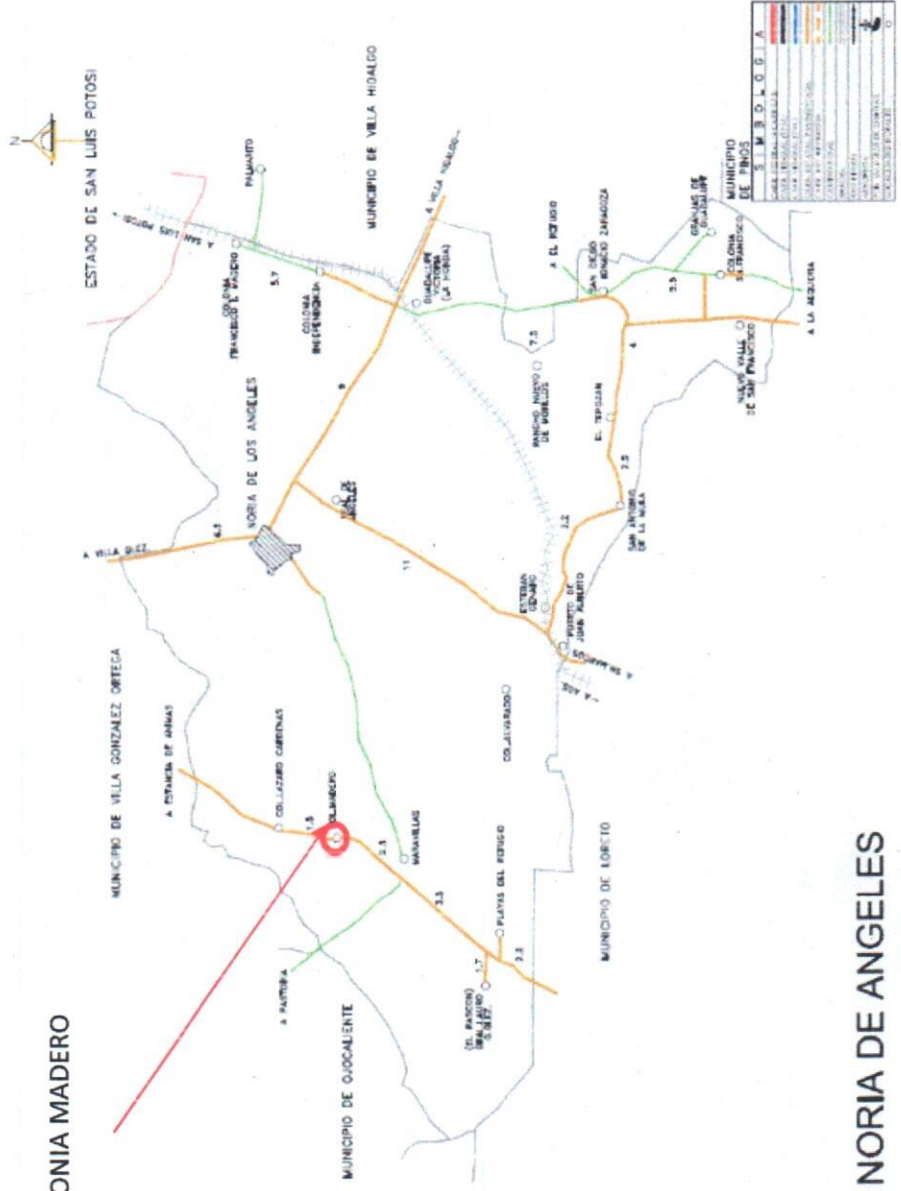

35. NORIA DE ANGELES

87132014 DE ANTONIO

CRISTINA MARIA

DECLARACION DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA EFECTOS DE LA LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

DECLARACION DE UNIDAD FAMILIAR

DECLARACION DE UNIDAD FAMILIAR PARA EFECTOS DE LA LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS




ONAPROSA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

CROQUIS DE OBRA

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC



AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS





ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: **02/03/2022**

LA COLONIA: **MARAVILLAS**

MUNICIPIO DE: **Noria de Angeles**

DECLARA QUE HA SIDO

SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION LA REALIZACION DEL PROYECTO

DENOMINADO:

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua

0

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION

Nelly Ger Posillas Becerra
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS



ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

ACTA DE ACEPTACION DE LA COMUNIDAD

FECHA: 02/03/2022

LA COMUNIDAD MATANILAS

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

SUBCOMITÉ DE SEGUIMIENTO Y PUESTO ASISTENCIAL EN EL EJECUCION DEL PROYECTO

LEY 1712/20

AMPLIACION DE 50 ML DE RED DE ALCANTABARIOS EN LA COMUNIDAD MATANILAS
MOR DE MATANILAS

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTES:

Relato de los hechos. A efectos de mantener unido el agua en las zonas de cultivo de la zona de San Juan de los Rios...

POR LO CUAL ESTAR DE ACUERDO CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y PUESTO ASISTENCIAL EN EL EJECUCION DEL PROYECTO Y SE COMPROMETE A DAR RESPUESTA A LOS REQUISITOS DE LA RED PARA LA OBTENCION DEL FOMENTO...

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA RED EN LA COMUNIDAD DE MATANILAS...

SR. MANUEL DEL ROSA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REPRESENTANTE DE LOS HABITANTES

Manuel del Rosa

100



**ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

LOS BENEFICIARIOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES): MARAVILLAS

DEL MUNICIPIO DE: Noria de Angeles, DEL ESTADO DE ZACATECAS,

SIENDO LAS: 9:00 HORAS DEL DÍA 02 de Marzo REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA

Calle Matamoros

, ESTANDO PRESENTES LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL Y DEL MUNICIPIO. ASÍ COMO LOS SOLICITANTES DE LA OBRA DENOMINADA:

AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC

BENEFICIANDO A 7 VIVIENDAS CON UN TOTAL DE : 90.00
ML

CON EL PROPÓSITO DE CONTITUÍR EL COMITÉ DE OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y COOPERAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

UNA VEZ APROBADAS LAS PROPUESTAS SE SOMETIÓ A VOTACIÓN PARA NOMBRAR A DICHO COMITÉ Y

RESULTARON ELECTAS LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Gustavo Esparza Salas
SECRETARIO: Maricela Tiscareño Gonzalez
TESORERO: Yolanda Becerra Horquedo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA: Irma Cisneros Campos

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDA A DAR POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA QUE LLEVA LA PRESENTE ACTA POR FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE OBRA

Gustavo Esparza

PRESIDENTE

Maricela Tiscareño

SECRETARIO

Yolanda Becerra M.

TESORERO

Irma Cisneros

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



ING. MANUEL BÉCERRA DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

LOS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN EST. MARAVILLAS
DEL MUNICIPIO DE MARAVILLAS
SE ENCONTRAN EN EL LIBRO QUE SE
ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO MARAVILLAS
CON LA DENOMINACIÓN

AMPLIACIÓN DE 35 ML DE RED DE ALICANTARILLADO EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS
-NOMBRE DEL PROYECTO-

DESEMPEÑO A
Y SE REALIZA CON UN TOTAL DE
ML

CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
BÁSICA Y COOPERAR AL MANEJO Y REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

UNA VEZ QUE LAS PROPUESAS SE HAYAN ADOPTADO PARA CONSTRUIR A DICHO COMITÉ Y
RESULTARON FAVORABLES PARA LAS PERSONAS

PRESIDENTE
SECRETARIO
TECERDO
VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDE A CERRAR LA REUNIÓN SIENDO
LAS HORAS DEL MEDIO DÍA QUE SE CERRA LA REUNIÓN POR TENER TERMINADO DE

CONFORMIDAD DE QUE SE CERRA LA REUNIÓN
COMITÉ DE GESTIÓN

PRESIDENTE
SECRETARIO

VOCALES DE CONTROL Y VIGILANCIA

SE REALIZA CON UN TOTAL DE
PRESIDENTE MUNICIPAL





REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA PARA LA TOMA DE DECISIONES, LECTURA DE ACTAS Y FIRMA DE ACUERDOS EN RELACIÓN AL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.

FECHA: 02/03/2022

LOCALIDAD: MARAVILLAS

MUNICIPIO: Noria de Angeles

No	NOMBRE	FIRMA
1	Gustavo Esparza Salas	Gustavo Esparza
2	Maricela Tiscareño Gonzalez	Maricela Tiscareño
3	Yolanda Becerra Marquez	Yolanda Becerra Marquez
4	Irma Cisneros Campos	Irma Cisneros
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		



REGISTRO DE VISITAS

ASISTENTE PARA LA TOMA DE DATOS DE ENCUESTAS DE MUESTREO Y FIRMAS DE LOS ENCUESTADOS EN EL MOMENTO DE LA VISITA

REGISTRO DE DATOS DE LA ENCUESTA DE MUESTREO

FECHA: _____

LOCALIDAD: _____

MANEJO: _____

TIPO DE AREA: _____

NUM. ENCUESTA	ENCUESTADO	ENCUESTADORA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

NORIA DE ÁNGELES, ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONÓMICO
NÚM. DE OFICIO: 106

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE OBRA

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA

Por medio del presente me permito notificarle que le fueron asignadas las obras denominada “AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y AMPLIACION DE 92 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC.” Para lo cual es sabido que cuenta con los recursos técnicos y financieros para realizar los trabajos a ejecutar en la obra mencionada.

Sin más por el momento le reitero mis saludos.

ATENTAMENTE

Noria de Ángeles, Zac. A 17 de Marzo del 2022
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC




T. S. U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

c.c.p.Archivo.

Municipio de Noria de Ángeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Ángeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

NORIA DE ÁNGELES ZAC.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DESARROLLO ECONOMICO
NUM. DE OFICIO: 116

ASUNTO: MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA.

POR MEDIO DEL PRESENTE TENEMOS A BIEN DARLE A CONOCER CUÁL SERÁ LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS: "AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y AMPLIACION DE 92 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC." QUE LA DESIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR EL PROCEDIMIENTO DE: **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SEÑALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AJUSTÁNDOSE A LAS CONDICIONES DE PAGO.

LAS CONDICIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS SERÁN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

NORIA DE ÁNGELES, ZAC, A 17 DE MARZO DEL 2022
DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC.



T. S. U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NORIA DE ANGELES, ZAC.
PERIODO: 2021-2024
OFICIO NO.: 94/2021

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. PEDRO LUIS CERVANTES SOTO
ORGANO INTERNO DE CONTROL
NORIA DE ANGELES, ZAC.

PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA **18/03/2022** SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "REHABILITACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC" SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

NORIA DE ANGELES, ZAC., A 18 DE MARZO DEL 2022
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



P.A. 
TSU. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

NORIA DE ANGELES, ZAC.

Recibi 25-03-22
Pedro Luis Cervantes S

c.c.p. Archivo

Municipio de Noria de Angeles, Zac.
Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

1910-1911
The [unclear]

NORIA DE ÁNGELES, ZAC.

CONTRATO DE OBRA N° NA-FIII/02/2022

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, A TRAVÉS DEL ~~ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA~~, PRESIDENTE MUNICIPAL; LA ~~PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ~~ SÍNDICO MUNICIPAL; LA T.S.U. ~~YANINE CASTILLO ZÚÑIGA~~, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL ~~ING. GUADALUPE SOTO RIOS~~, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "MUNICIPIO" Y POR LA OTRA EL C. RAUL MACIAS ROBLEDO, CON R.F.C. MARR711227HH9, QUIÉN SE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, SOMETIÉNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

- PRIMERA.- EL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DECLARA:
- 1.- QUE ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN LOCAL, QUE SUS REPRESENTANTES FUERON ELECTOS MEDIANTE LOS PROCESOS DE LAS LEYES ELECTORALES DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON LA FACULTAD QUE LES OTORGA LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
 - 2.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA OBRA, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)
 - 3.- QUE ENTRE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE Y LA SÍNDICO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA LA DE CELEBRAR CONTRATOS CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 80 Y 84 FRACCIONES III Y IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
 - 4.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 98880, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MNA8501012Q7 NORIA DE ÁNGELES, ZAC., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
 - 5.- SE ENTIENDE POR ENTE PÚBLICO: A LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN INTERVENIR DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.

Municipio de Noria de Ángeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Ángeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

6.- SE ENTIENDE POR CONTRATISTA A LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

7.- QUE LA DESIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: **ADJUDICACIÓN DIRECTA** CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, QUE SEÑALAN RANGOS PARA DECLARAR TIPO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL ARTICULO 3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A.- SER UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LO ACREDITA CON EL R.F.C. **MARR711227HH9**. QUE TIENE SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA PARA PROVEER LOS GASTOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. SER MEXICANO LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO NO. 656, FOJA 167 DEL LIBRO UNO DE NACIMIENTOS DEL AÑO DE 1971 DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL DE LORETO, ZACATECAS.

B.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE GONZÁLEZ BOCANEGRA NO. 406, COL. TORRES, LORETO, ZAC. MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENGAN EN SU EJECUCIÓN DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

TERCERA.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A.- SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU CUMPLIMIENTO.

B.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMÁS DE LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN UN FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.


C.- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTREN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

R.M.R.
MEM



ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ESTANDO DE ACUERDO CADA UNA DE LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL MUNICIPIO ENCOMIENDA AL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE DOS OBRAS CONSISTENTES EN:

- AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y
- AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO "E" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: \$130,670.80 (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.) DE LA OBRA -AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y \$39,520.75 (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N.) DE LA OBRA AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. INCLUYENDO EL I.V.A. (OBRA FINANCIADA HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO). ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO POR LO QUE SÍ "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2022 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SE OBLIGAN A PONER A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO.- EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO, YA QUE SU EMPRESA CUENTA CON LOS MEDIOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE ORIGINE LA CONSTRUCCION DE DICHAS OBRAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 110 Y 111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" MISMAS QUE SERÁN EVALUADAS PARA EL INICIO DEL PAGO.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR "EL CONTRATISTA" Y/O REPRESENTANTE.

LOS NÚMEROS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DEBERÁN DIBUJAR LOS CROQUIS QUE SEAN NECESARIOS Y SE DEBE REALIZAR UNA RECOPIACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS.

"EL CONTRATISTA" ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN DE MANERA CLARA, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE TAL FORMA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE A LOS AVANCES CORRESPONDIENTES. EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON TODA LA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.


SÉPTIMA.- GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, HA PRESENTADO EN ESTE MOMENTO LAS PÓLIZAS DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 101 FRACCIONES I Y II, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES, ZACATECAS, CUMPLIENDO ASÍ CON EL TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA CONCLUIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A "EL MUNICIPIO" UNA VEZ

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com



CONCLUIDOS LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 149 DE LA CITADA LEY POR EL 10% PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS QUE GENEREN UN INCREMENTO O REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SUPUESTOS EN EL QUE ESTARÁ DISPUESTO POR LO ESTABLECIDO EN LOS GASTOS ARTICULO 28,29, 32 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, ASÍ COMO 105 AL 106 DE SU REGLAMENTO.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 FRACCION IX Y ARTICULO 112 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SE DEVEN PREVER LOS PAGOS EN EXCESO, EN CUYO CASO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN, ASÍ COMO LOS INTERESES QUE SE LLEGARAN A GENERAR A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA TENIDO LUGAR EL PAGO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO"

DECIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESTOS SE REALIZARAN DE MANERA TOTAL CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS "EL MUNICIPIO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A JUICIO EXISTIRÁN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA" PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

Municipio de Noria de Angeles, Zac.


Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

MEM

R.M.R.

7



NOMBRAR UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA, CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE OBRA DEBERÁ ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES. SERÁ "EL CONTRATISTA" EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEBERÁ APEGARSE A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE SUPUESTO ESTABLEZCA "EL MUNICIPIO"; SERÁ ADEMÁS RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CARGOS QUE RESULTEN.

DÉCIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LAS OBRAS: "-AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y -AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC." OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS RIESGOS DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. IGUALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS POR ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN RELACIÓN AL PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO "EL MUNICIPIO" TENDRÁ LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

MEM

2

0

R.m.R

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERÁN DEVUELTOS SI "EL CONTRATISTA" DA TÉRMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, CUYAS SANCIONES PODRÁN SER HASTA EN UN 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO NO REALIZADO DURANTE EL MES QUE CORRESPONDA O A LA FRACCIÓN RESPECTIVA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO", MEDIANTE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, LOS CUALES SERÁN DEVUELTOS SI "EL CONTRATISTA" DA TÉRMINO A LOS TRABAJOS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO, DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSA IMPUTABLES AL DE "EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO SE ATRIBUYA LA CULPA A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "EL MUNICIPIO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 Y 139 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 121 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE TODO O EN PARTES LAS OBRAS: "-AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y

-AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC." CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE HARÁ LA COMUNICACIÓN "AL CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

MEM

Handwritten signature and initials.

CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO O DE DIVERSA ÍNDOLE, LAS PARTES ACUERDAN INICIALMENTE RESOLVERLAS POR LA VÍA DE LA CONCILIACIÓN Y CUANDO ESTO SEA POSIBLE, SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA EXPONER LO QUE A SUS INTERÉS CONVENGAN, CUYO PLAZO INICIARA A PARTIR DE QUE SURJA EL INCIDENTE DE QUE SE TRATE.

"EL MUNICIPIO".- POR SU PARTE EVALUARÁ LOS ARGUMENTOS Y EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL "CONTRATISTA" PRESENTE SUS ARGUMENTOS, SIENDO ESTA DETERMINACIÓN INAPELABLE.

DECIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A INICIAR INMEDIATAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES. LAS PARTES SE OBLIGAN A QUE LAS OBRAS: "-AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y

-AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC." OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE CONTRATO, CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LOS PROPUESTOS POR "EL

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com

R.M.R. HEM
7
C

009 13

CONTRATISTA" Y POSTERIORMENTE VALIDADOS POR "EL MUNICIPIO" Y GOBIERNO DEL ESTADO.

DECIMA NOVENA.- JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE LAS OBRAS: "-AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC. Y

-AMPLIACION DE 92 ML DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES, ZAC.", ASÍ COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE NI NINGÚN OTRO VICIO QUE PUEDA ANULAR EL CONTENIDO LEGAL DEL MISMO.

SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS, EN ORIGINAL Y COPIA AL 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NORIA DE ANGELES, ZACATECAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA

PROFRA. MARIANA EGUREN MARTINEZ

**LA DIRECTORA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL**

**EL DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS**

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA

ING. GUADALUPE SOTO RIOS

DIRECCION DE
DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES, ZAC.

OBRAS PUBLICAS
NORIA DE ANGELES, ZAC.


EL CONTRATISTA

C. RAUL MACIAS ROBLEDO

Municipio de Noria de Angeles, Zac.

Calle Hidalgo S/N Noria de Angeles, Zac.

Tels. 496 967 7013, 496 967 7014, 496 967 7047 Correo Electrónico: presidencianoria@hotmail.com





RAUL MACIAS ROBLEDO



Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560

ASUNTO: Presupuesto

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA


DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO

NORIA DE ANGELES ZAC

PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y así mismo me permito presentarle el presupuesto para la obra denominada: **AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC**

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
PRELIMINARES				
trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	72.00	11.75	846.00
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	M3	14.40	45.92	661.25
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	M3	64.80	306.82	19,881.94
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberías, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	M3	3.60	600.00	2,160.00
Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua	M3	36.00	25.45	916.20

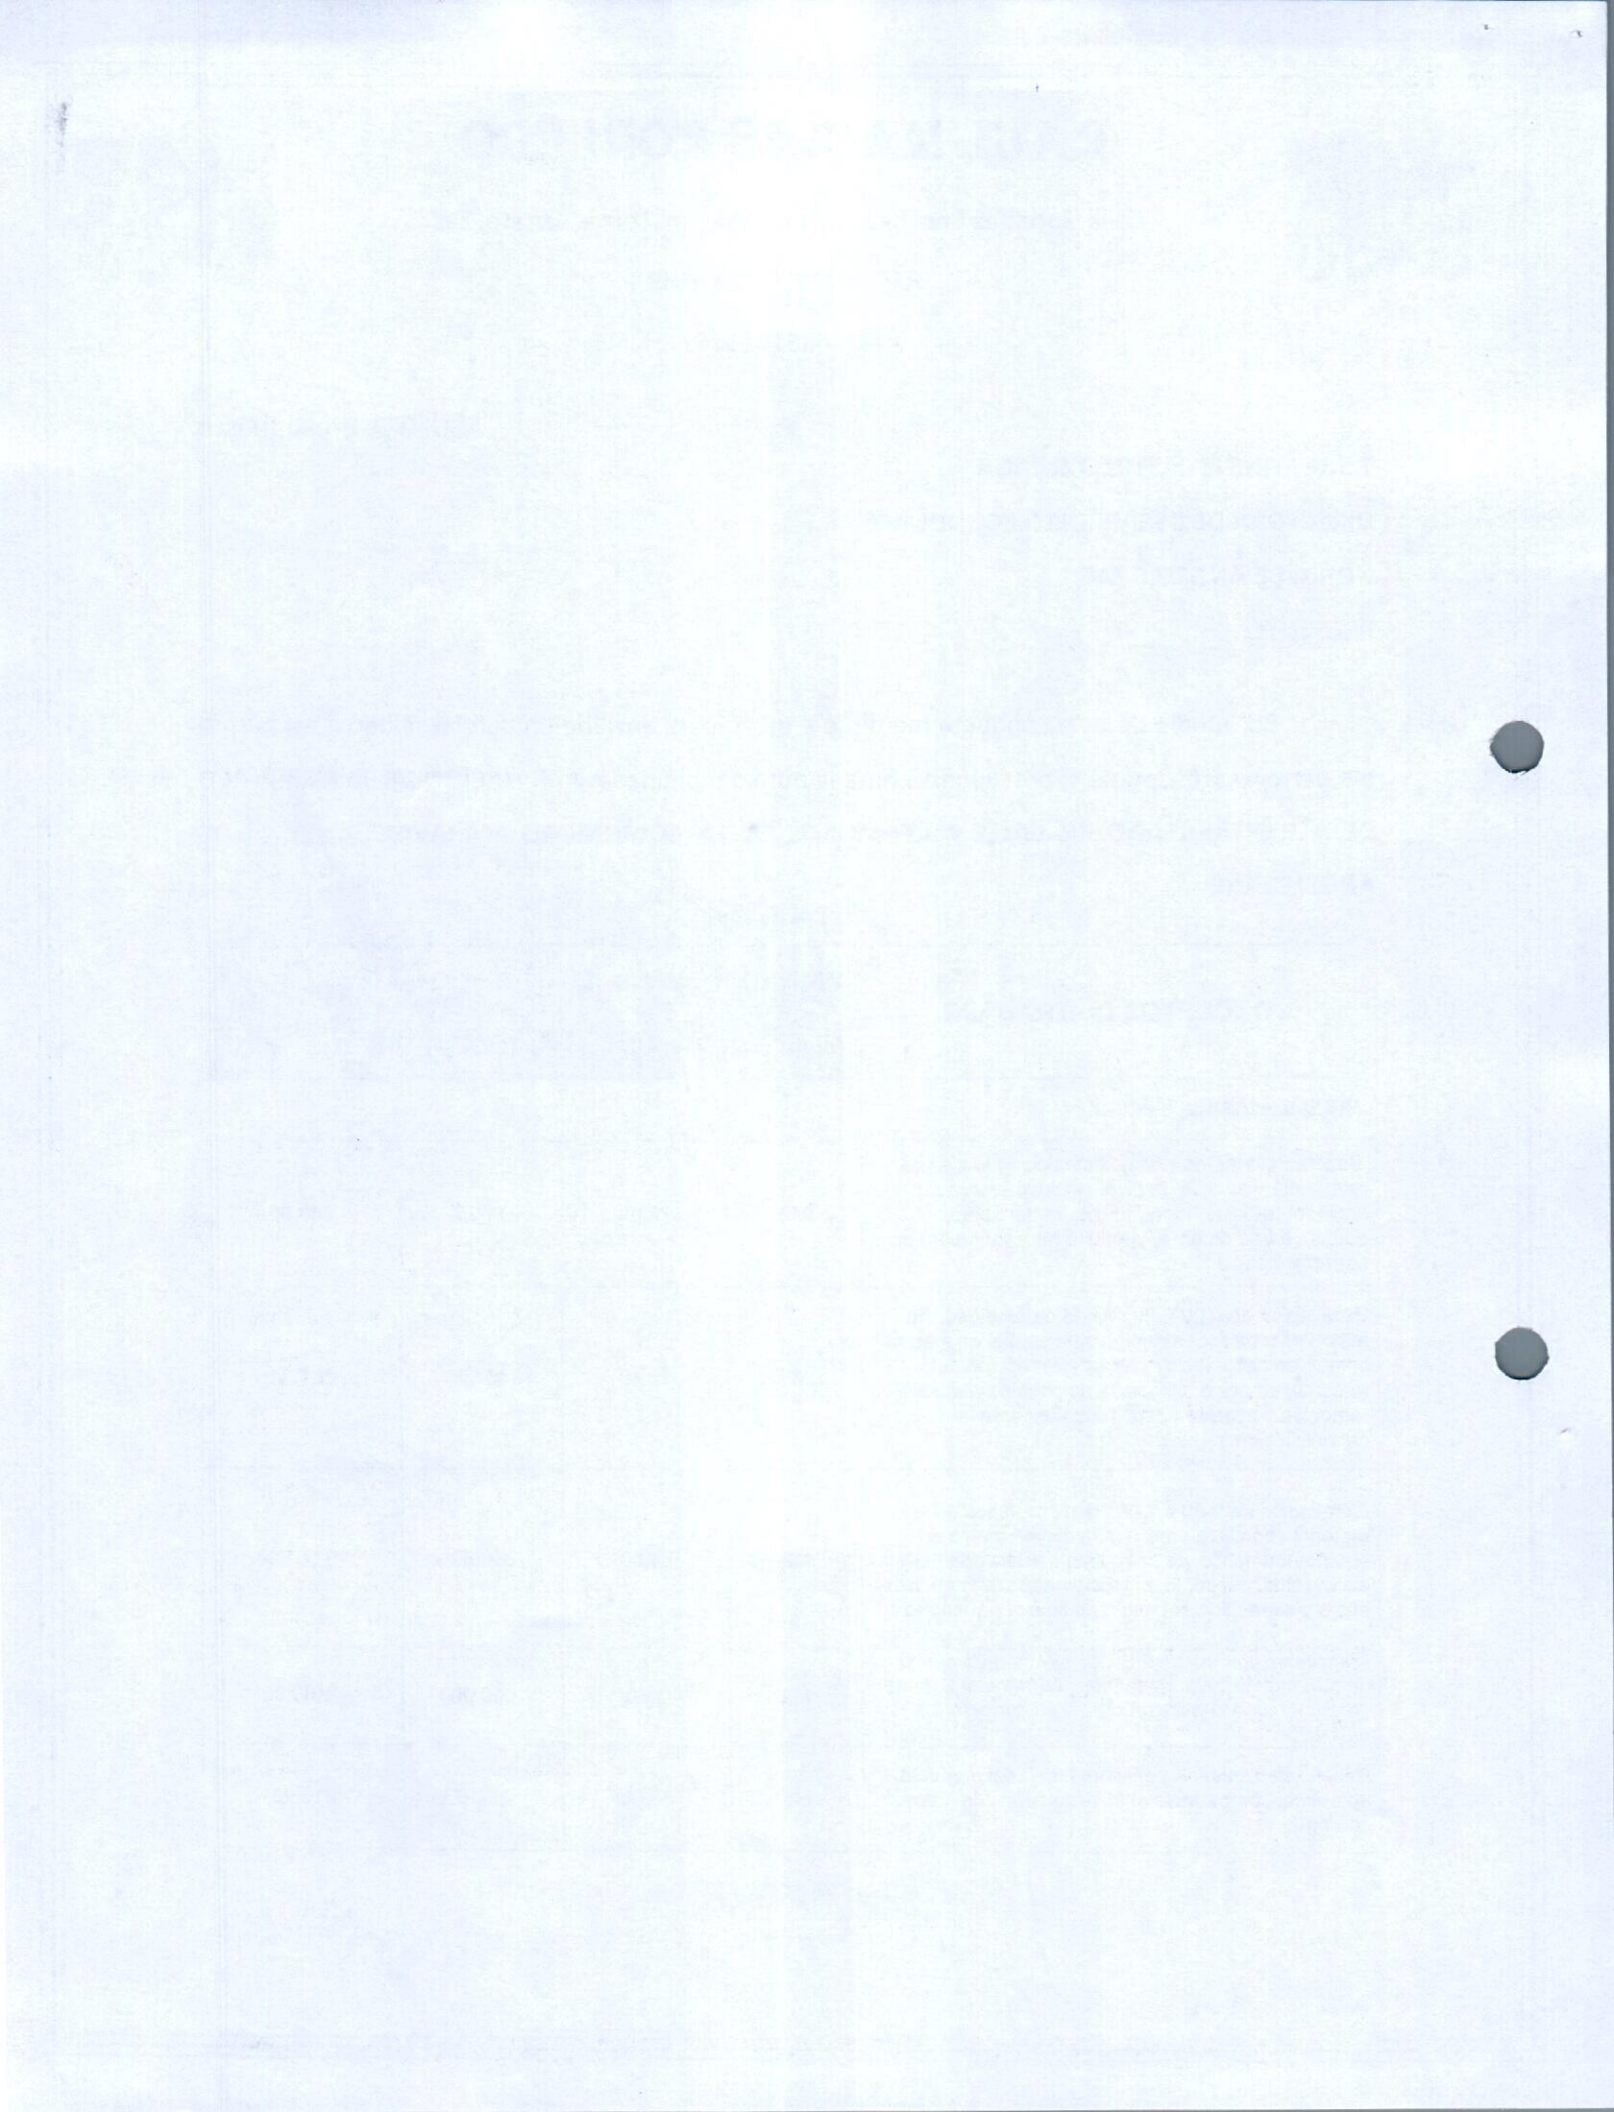



RAUL MACIAS ROBLEDO


Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560



Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón, con material producto de banco.	M3	36.00	154.14	5,549.04
Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 200 mm (8") Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, incluye traslape o de tubo, el suministro hasta el sitio de la obra, acarreo, maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ML	90.00	31.00	2,790.00
POZOS DE VISITA			SUBTOTAL	32,804.43
POZOS DE VISITA				
Excavación de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes de remocion acarreo hasta 10mts. Dentro del area de contruccion.	M3	1.28	45.16	\$ 57.80
Excavación de 0,00 a 2,00mts. de profundidad en material duro en roca fija para desplante de estructuras. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	M3	3.28	306.82	\$ 1,006.37
Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo necesario P.U.C.T.	PZA	2	6,928.77	\$ 13,857.54
Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ciega(W=122 KG)	PZA	2	3,272.03	\$ 6,544.06
POZOS DE VISITA			SUBTOTAL	21,465.77
SUMINISTROS				
Suministro de tuberíade P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8") Ø que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.	ML	90.00	409.59	36,863.10
SUMINISTROS			SUBTOTAL	36,863.10
DESCARGAS DOMICILIARIAS				
Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejeucion.	M2	25.20	11.75	296.10





RAUL MACIAS ROBLEDO



Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560

Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material "comun". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	M3	5.04	45.92	231.44
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "duro". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	M3	12.60	306.82	3,865.93
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberías, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	M3	2.52	600.00	1,512.00
Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua	M3	10.08	25.45	256.54
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón,con material producto de excavacion.	M3	8.40	154.17	1,295.03
Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	M.L.	42.00	22.50	945.00
Suministro de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ML.	42.00	225.45	9,468.90
Codo de PVC con junta hermetica de15 cms.(6")SERIE 25	PZA	7.00	130.66	914.62
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM	PZA	7.00	182.34	1,276.38
Limpieza general de la obra	m2	132.00	11.00	1,452.00
DESCARGAS			SUBTOTAL	\$ 21,513.94
			TOTAL	112,647.24
			IVA 16%	18,023.56
			TOTAL	130,670.80

ATENTAMENTE

Raul Macias R.

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA



RAUL MACIAS ROBLEDO

Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560



ASUNTO: Calendario de Ejecución

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC
PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y así mismo me permito presentarle el calendario de ejecución para la obra denominada **AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PREELIMINARES	
trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel . Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejeucion.	MARZO
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material zona B con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area deconstruccion.	MARZO
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material zona B, en roca fija. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	MARZO
Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberias, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	MARZO
Relleno de zanjas A volteo con material producto de banco.Compactado al 85% en capas de 20cm con agua	ABRIL

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN

RAUL MARIN



RAUL MACIAS ROBLEDO

Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560



Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón, con material producto de banco.	ABRIL
Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 200 mm (8") Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, incluye traslape o de tubo, el suministro hasta el sitio de la obra, acarrees, maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
POZOS DE VISITA	ABRIL
Excavación de 0,00-2,00 mts. de profundidad. En material comun. con equipo para desplante de estructuras en seco, afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes de remocion acarreo hasta 10mts. Dentro del area de construccion.	ABRIL
Excavación de 0,00 a 2,00mts. de profundidad en material duro en roca fija para desplante de estructuras. Incluye empleo de equipo neumatico y/o maquinaria adecuada para la excavacion, asi como extraccion de rezago en seco, afloje y extraccion del material, amacice y limpieza.	ABRIL
Pozo de visita comun hasta 1.25 mts de profundidad, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, enjarrado y acabado pulido, asi como herramienta y todo lo necesario P.U.C.T.	ABRIL
Suministro e Instalacion de Brocales para pozo de visita, instalacion. Mediano con tapa ciega (W=122 KG)	ABRIL
SUMINISTROS	ABRIL
Suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado Serie 25 de 200 mm (8") Ø que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995, sistema metrico.	
DESCARGAS DOMICILIARIAS	
Limpieza y trazo en el area de trabajo estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye estacado, enclado, trabajos topograficos, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ABRIL
Excavación de 0.00-6.00 mts de profundidad. En material "comun". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area de construccion.	ABRIL
Excavación de 0.00 a 2.00mts de profundidad en material "duro". con equipo para zanjas en material común en seco. Incluye afloje y extraccion del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remocion y acarreo hasta 10mts del area de construccion.	ABRIL

RAUL M. DE ROBERTO

El presente informe tiene como finalidad...

Fecha: 15/04/2023

ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...
ABRIL	El presente informe tiene como finalidad...



RAUL MACIAS ROBLEDO

Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560



Plantilla apisonada de 5 cm de arena, para apoyo de tuberías, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación	ABRIL
Relleno de zanjas A volteo con material producto de excavacion.Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua	ABRIL
Compactado al 85% en capas de 20 cm con agua. y a rebote de pisón,con material producto de excavacion.	ABRIL
Instalación y junteo de tubería de P.V.C. Tubería de 160 mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
Suministro de tubería de P.V.C. Tubería de 160 .mm (6")Ø Serie 25, que cumpla con las Normas NMX-E-229-1999-SCFI Y NOM-001-CNA-1995 ,incluye traslape o de tubo ,el suministro hasta el sitio de la obra, acarreos ,maniobras locales, almacenaje todo lo necesario por unidad de obra terminada.	ABRIL
Codo de PVC con junta hermetica de 15 cms.(6")SERIE 25	ABRIL
SILLETA PVC con desviacion de 45 grados de 200x160MM	ABRIL
Limpieza general de la obra	ABRIL



ATENTAMENTE

Raul macias R

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA

RAUL M. A. ORLEDO

Este documento es propiedad de Raul M. A. Orledo

1980	...
1981	...
1982	...
1983	...
1984	...
1985	...
1986	...
1987	...
1988	...
1989	...
1990	...

RAUL M. A. ORLEDO



RAUL MACIAS ROBLEDO

Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961054338



ASUNTO: CONOCER EL SITIO DE LA OBRA.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC
PRESENTE:

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONÓ, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, NOS HUBIERE PROPORCIONADO LA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

Sin más por el momento quedo de usted como su más atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Raúl Macías R.

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA



RAUL MACIAS ROBLEDO



Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560

ASUNTO: ACEPTACION DE OBRA.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC
PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo de mí parte, me es grato informarle que acepto la obra denominada: **AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC**

Con especificaciones y características según establece el catálogo de conceptos de dicho proyecto.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con la normatividad de los programas y contestación a su petición de respuesta al oficio antes mencionado.


Sin más por el momento quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Raul Macias R.

C. RAUL MACIAS ROBLEDO
EL CONTRATISTA







RAUL MACIAS ROBLEDO



Calle González Bocanegra Núm. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560

ASUNTO: INICIO DE OBRA.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC
PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en el día **18 del mes de Marzo del 2022**. Se dio inicio con los trabajos de la obra denominada: **AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC**

Con número de contrato: **NA-FIII/02/2022**


Lo anterior con la finalidad de dejar constancia del inicio de los trabajos de referencia conforme al contrato suscrito.

HACIENDO CONSTAR QUE:


1. Se dispone del proyecto de ejecución de los trabajos y del terreno en condiciones para el comienzo de la obra.
2. Manifestando también estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados.
3. Que se dispone de los medios organizativos, materiales y humanos adecuados para la ejecución de la obra proyectada así como también que se cuenta con el plan de seguridad requerido.

Sin más por el momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



C. RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA





RAUL MACIAS ROBLEDO



Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560

ASUNTO: SUPERVISOR DE OBRA

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES
PRESENTE:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que para la obra denominada: **AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC**

Con numero de contrato N° NA-FIII/02/2022.

Se ha designad a **RAUL MACIAS ROBLEDO** como superintendente para esta obra.

El cual está facultado y autorizado para cualquier toma de decisiones que para la obra corresponda.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento con la normatividad y lineamientos de los programas.

Sin más por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL CONTRATISTA

C. RAUL MACIAS ROBLEDO



10-10-10





RAUL MACIAS ROBLEDO

Calle González Bocanegra Num. 406, Col. Torres, Loreto, Zac.

RFC. MARR711127HH9

TEL. 4961423560



ASUNTO: RENUNCIA ANTICIPO DE OBRA.

T.S.U. YANINE CASTILLO ZUÑIGA
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
NORIA DE ANGELES ZAC
PRESENTE:

Por el presente medio y de la manera más atenta, le comunico que para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACION DE 90 ML DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS, NORIA DE ANGELES ZAC., RENUNCIO AL ANTICIPO, ya que cuento con la liquidez necesaria para cumplir con los trabajos necesarios para la construcción de dicha obra.

Sin más por el momento, se agradece de antemano su valiosa atención y se aprovecha la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Raúl Macías Robledo

RAUL MACIAS ROBLEDO
CONTRATISTA DE LA OBRA

